

匯盟能源股份有限公司
布袋/義竹太陽能光電系統工程
暨外管線建置工程施工說明會
龍蛟村 (第四期)
民國115年03月27日

15:25-15:30 簽名報到
15:30-15:45 施工說明會簡報
15:45-16:00 問與答 Q&A
16:00 活動結束

目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

匯盟能源公司介紹


- 公司名稱：匯盟能源股份有限公司
- 統一編號：83770686
- 資本總額：900,000,000
- 實收資本額：880,000,000
- 公司所在地：臺北市信義區松仁路97號16樓
- 核准設立日期：109年06月11日
- 布袋地區辦公室：2545嘉義縣布袋鎮261號



集團介紹 Lightsource bp

我們的優勢

全球太陽能建置、維運、管理服務



以我們的核心價值觀為基礎：

安全、誠信、尊重、可持續發展的動力



開發和構建

我們最近被評為世界上最大的太陽能開發商，在開發太陽能資產方面建立了良好的記錄，從早期的開發、投資至施工建置。



管理和運營

我們的團隊在管理與運營太陽能電廠的專業上，有超過12年的經驗。這包括Lightsource bp擁有的專案和協力廠商的合作專案。



合作夥伴關係

為加速能源轉型，我們在全球提供各種機會，讓投資人可以在綠能實績上有顯著成長。

目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍**
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

預定施作範圍-匯盟布袋專案-施工許可

本次施工說明會對應之施工期別：
第四期之1

➢ **全案地理位置:**

嘉義縣布袋鎮、義竹鄉漁電共生 先行區、優先區範圍。

➢ **地段:**

保安宮段、龍蛟潭段龍蛟小段、鹿寮段等地段。

➢ **本次說明會施作面積: 2.4公頃。**


(匯盟布袋案全案土地施作面積150公頃)

➢ **(已完工)升壓站位置:**

嘉義縣布袋鎮考試潭段鹿寮小段306-1地號。

➢ **現況: 魚塢**

➢ **施作工程: 匯盟能源漁電共生電廠**

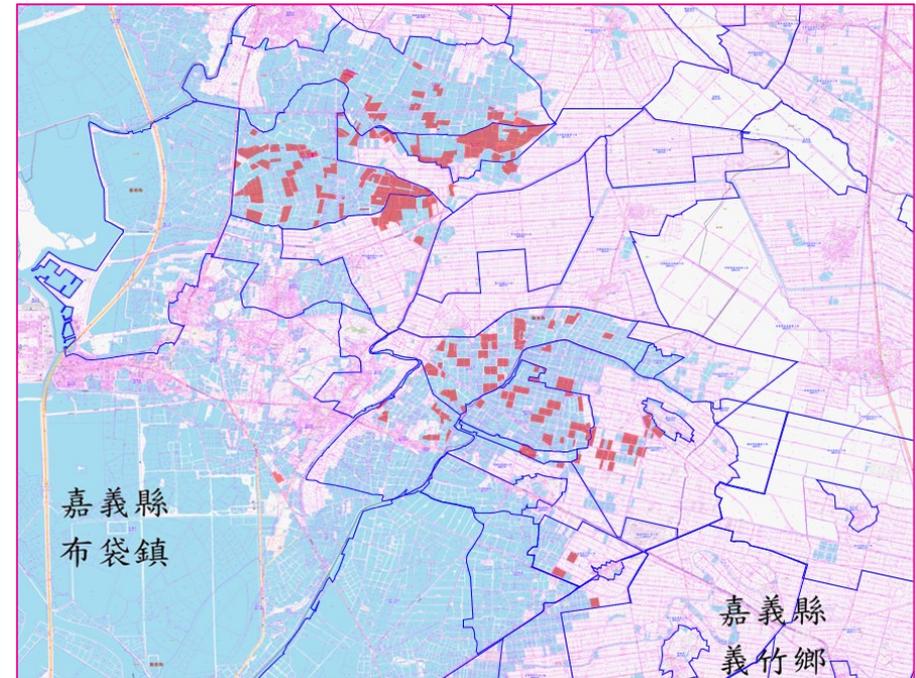

法源依據： 第四期之1

適用現行法規電業登記規則第3-4、3-2條規定辦理

太陽光電發電業申請籌設或擴建許可前，其主要發電設備設置於地面者，應於主要發電設備所占面積最大之村（里）辦理地方說明會。

施工許可期別	設備村里	設備占比	占比最大設備村里	設備占比最大
第四期之1	龍蛟村	56%	龍蛟村	50%
	考試里	31%		
	東安里	23%		

目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程**
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

施工期程甘特圖-光電案場

本次施工期程預定如下，相關施工進度依照能源局核發施工許可時程而調整
會依能源局施工許可核發後，陸續通知養殖業者、地主進行點交

通知點交日期於**2024年3月至2025年4月**期間陸續辦理。將依照土地租約、與地主以及養殖業者魚塭使用現況進行點交時程調整。

光電案場施工進度表



目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式**
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

工程項目


光電區域內工作與施工項目如下



抽水施工



基地整地施工

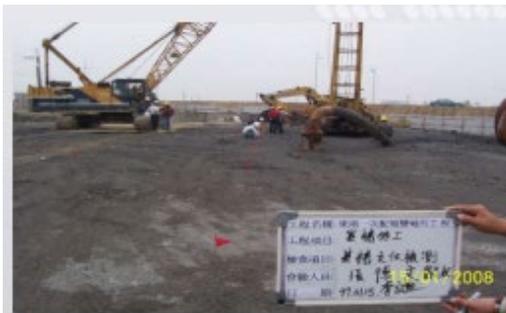

基樁施工



試樁施工

工程項目

光電區域內工作與施工項目如下



基礎立柱



基礎立柱



鋼構組裝



鋼構組裝



太陽能板安裝




竣工

排鋪設計原則

- 本案總建置共計申請 115個農業容許
- 所有案場建置皆依法規規範，不超過 **40%** 之覆蓋率
- 匯盟三期總計建置容量達**115MW**，預計可供：



81.3萬
家庭年用電量




減少 154萬噸
二氧化碳排放





156公頃
造林效益

- 本次鋪設以以下兩種型態為主：
 1. 東西向7度傾斜
 2. 南向10度傾斜
- 鋪設原則上尊重養殖業者、地主、農田水利署以及嘉義縣政府的審查意見。最大程度依照養殖業者作業習慣以及養殖生物型態進行安排。


施工方式與電廠支架結構設計說明

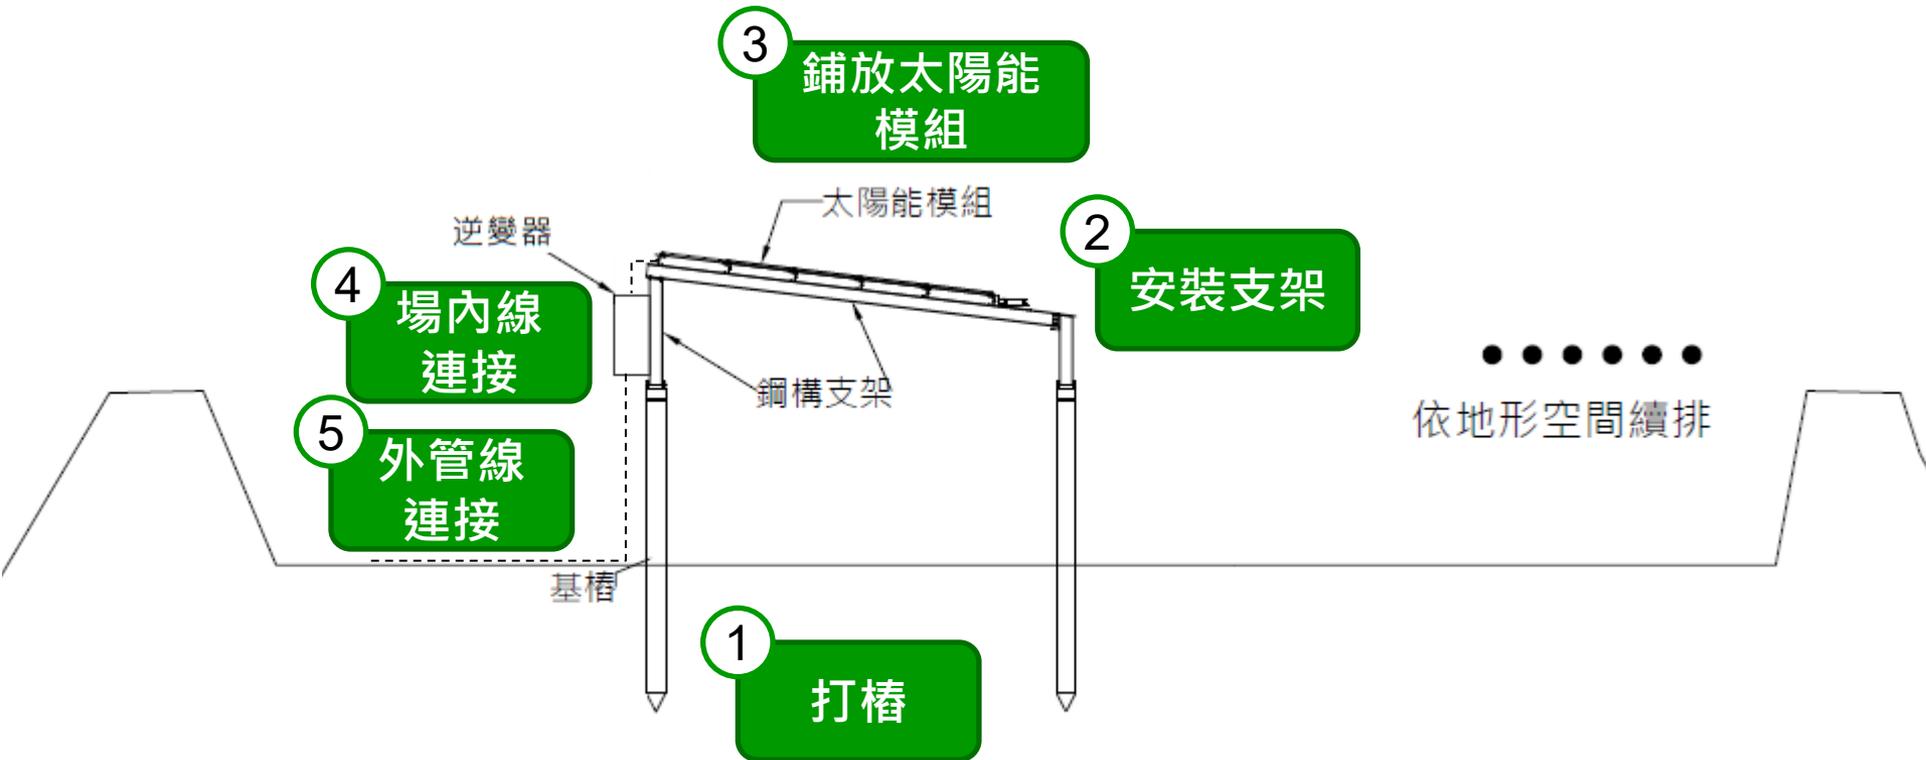

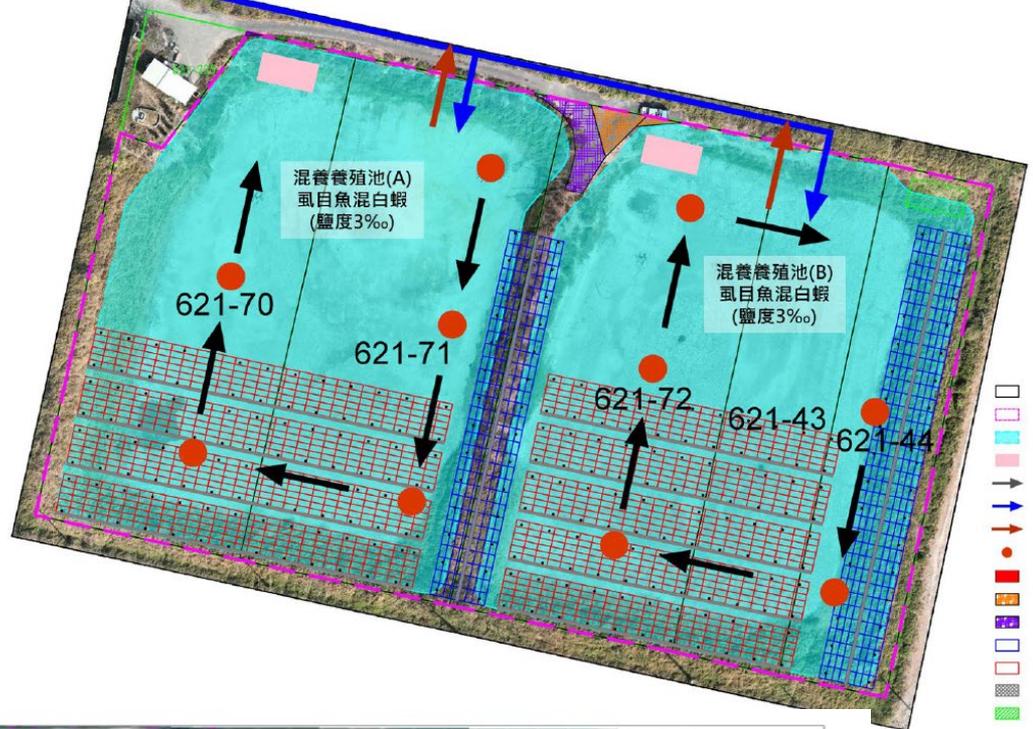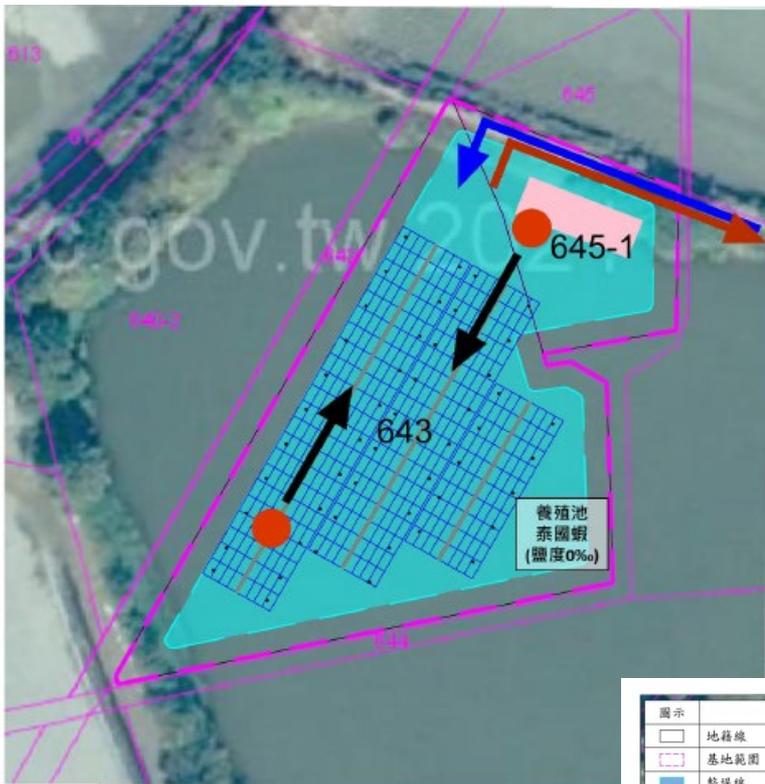

- 地籍線
- 基地範圍
- 收成區
- 水推
- 排水
- 水壩
- 轉運
- 自給
- 綠
- 綠
- 綠

圖示	說明
	地籍線
	基地範圍
	整埤線
	進排水方向
	收成區
	電力室
	轉運及操作處理場
	水產養殖生產設施(進排水道)
	綠能設施(太陽光電模組、傾角7度)
	綠能設施附屬設施(維修步道)

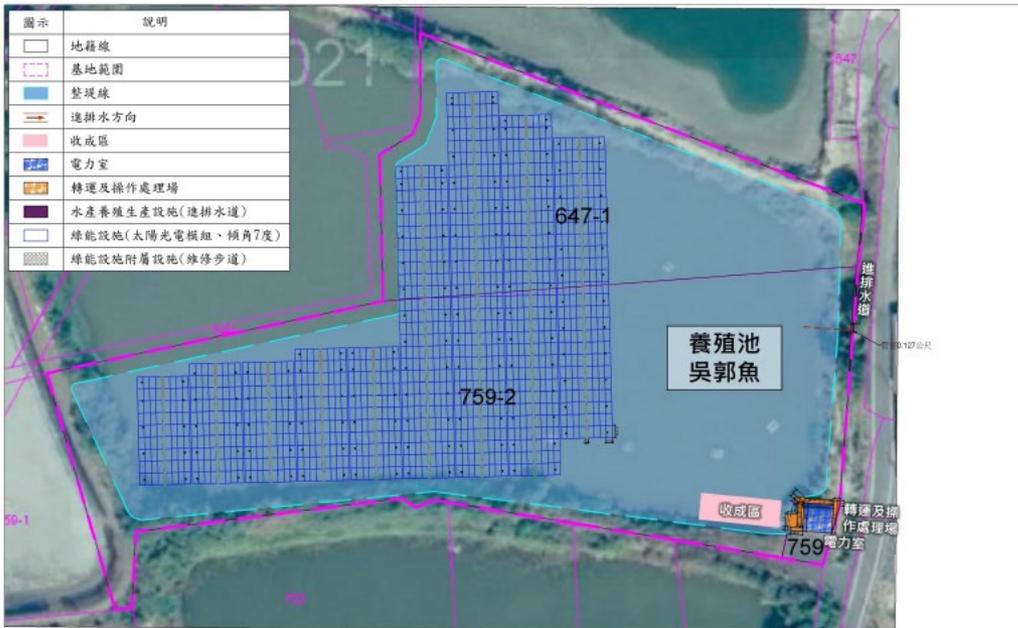

光電案場鋪排範例



Safety
Integrity
Respect
Sustainability
Drive

電業籌設、施工許可送件容量差異

電業登記規則第3-4條規定辦理

太陽光電發電業辦理第三條第一項第二款第六目所定之工程計畫地方說明會，應說明工程計畫之基本資料、工程概要（應包含預定施作範圍、施工期程、工程項目與施工方式，及其與籌設或擴建計畫內容之差異）與保障公共通行及其替代措施等事項；其餘辦理程序準用前二條規定。

電業籌設期別	電籌容量(KW)	施工許可期別	施工許可容量(KW)	施工許可已送件/ 核可容量總計
電籌第四期	3,358.3	先前已核可	0	1,532.30
		第四期之1	1,532.30	

目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫**
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

工法說明

外管線工作與施工項目如下

明挖工法
Open cut

係指露天開挖工法，亦即由地面直接向地下開挖至所需深度，再施築結構體，完成後再覆土至地表的施工方式，由開挖至覆土過程中，則須配合各種設備及支撐方式，以維護施工中安全。




工法說明

外管線工作與施工項目如下


H.D.D導鑽工法

Horizontal Directional Drilling method


HDD導鑽工法 (Horizontal Directional Drilling) 也可稱作HDD潛鑽工法，它是橫向水平施工法，用來埋設管路的方法中的一種方法。當管線埋設時遭逢到橋樑、溪流或河流、高速公路、鐵路、或者如台中港需穿越海堤及海底或農委會由海岸邊穿入海底取水等工程，需配合HDD導鑽工法。導鑽工法利用鑽機配合穩定液(皂土)，先行導鑽鑽孔後繼續多次擴孔，再修孔，達到足以容納設計所要求，再利用鑽機順利又安全地將管線從到達坑之管端拖曳拉回 (Drag Pulling back) 到鑽入坑，此一過程就叫HDD導鑽工法，如能發揮出HDD導鑽工法之功能，將管線順利並安全地埋入土中，以供配電纜或供輸油、輸氣、輸水、抽水之效用。



1. 導向鑽掘

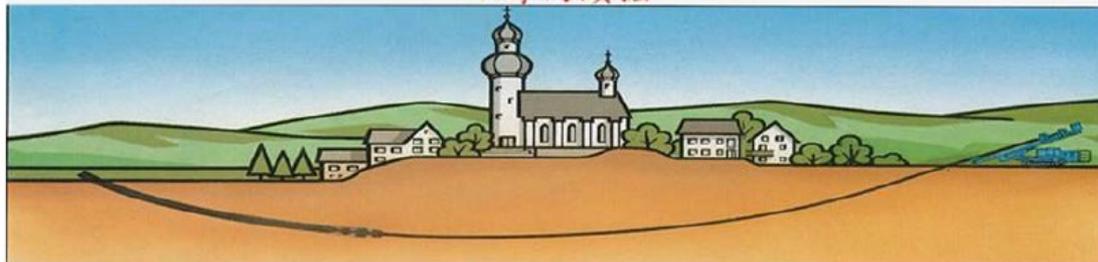


2. 拉管

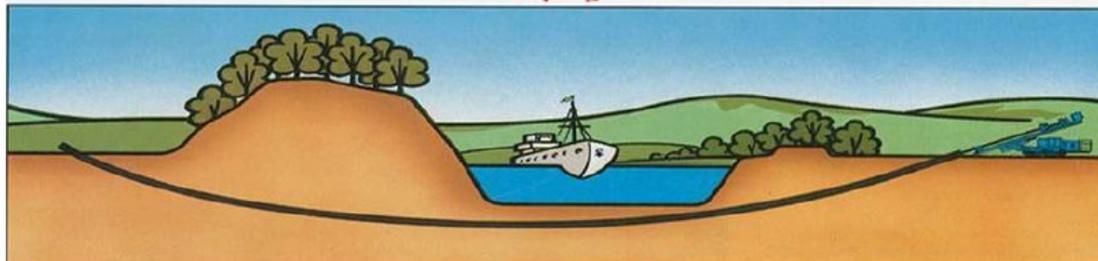

3. 佈管完成



整體交維路線總覽

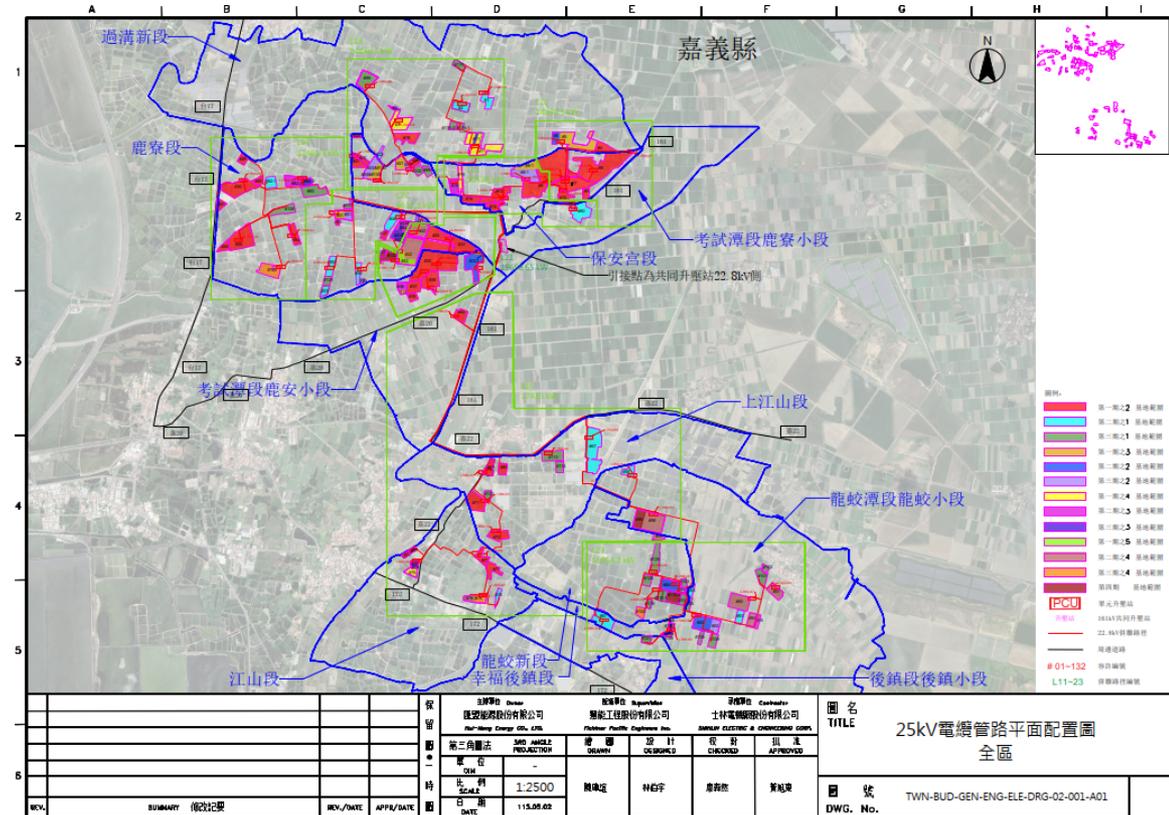

路線起點：各案場

路線終點：嘉義縣布袋鎮考試潭段鹿寮小段306-1地號。

全長：約29公里


(會依照日後路權、路證申請滾動調整)

交通管制期間,夜間會設置警示燈和夜間燈,也會有24小時交管人員

假日不施工,過年,端午連假,清明節,中秋節,國慶日,配合縣府和公路總局等道路申請單位之執行。



中壓管道路徑_北區

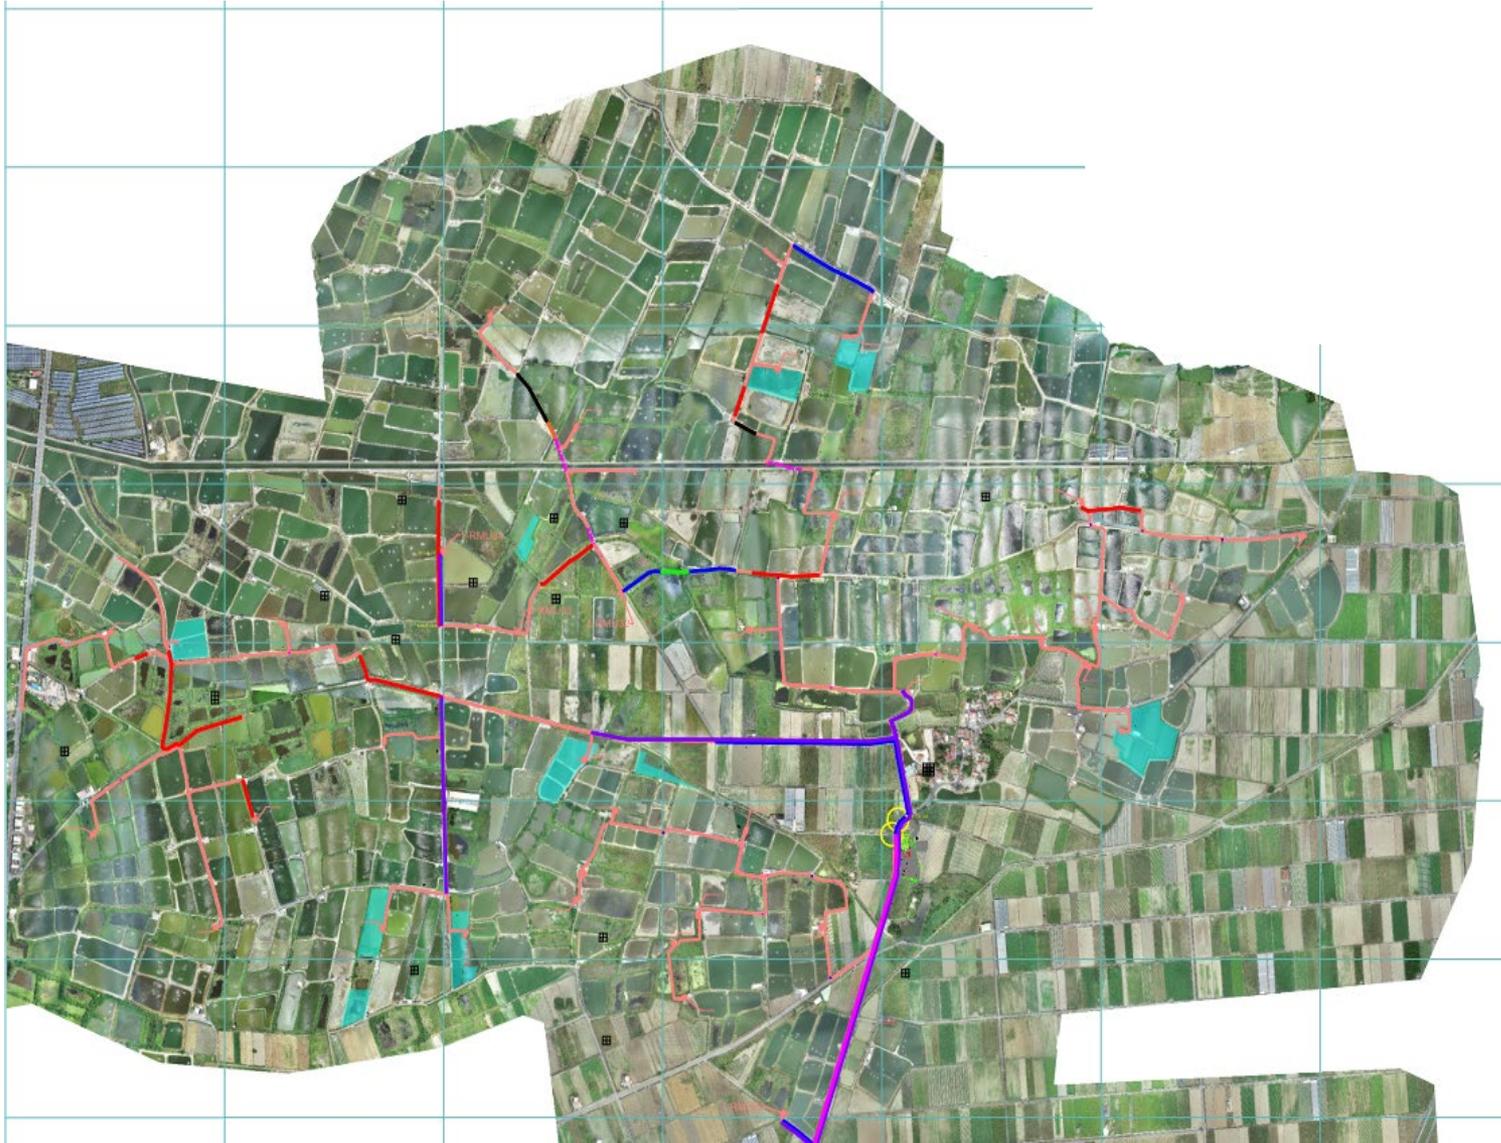



中壓管道路徑_南區



中壓管道施工

施工前7天前於施工周圍張貼施工公告並立施工告示牌



2025年9月3日 (週三)
下午2:18



2025年9月3日 (週三)
下午2:16



2025年9月4日 上午11:30:00
台灣
625006 嘉義縣 布袋鎮
縣道161

中壓管道施工

施工時申請路證和安排交維人員管制車輛



中壓管道施工

施工後灑水車灑水減少塵揚



目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理**
- 七、緊急應變計畫

安全與衛生管理

本公司依「職業安全衛生管理辦法」實行

施工前

1. 風險評估：整體工程風險辨識/評估/控制
2. 施工計畫：整體工程職安衛計畫撰寫及執行規劃
3. 每日工具箱會議及危害告知安全宣導
4. 人員車輛機具設備進場申請管制
5. 工作區域交通管制規劃
6. 環境保護防制措施規劃

施工中

1. 工地負責人全程監督
2. 職安衛人員現場巡檢
3. 交通疏導人員全程管制車輛
4. 各項作業項目辦理自動檢查鄰路作業/高處作業/局限空間/吊掛作業等
5. 安衛缺失項目立即矯正改善
6. 周遭道路/作業區灑水防塵
7. 個人防護具提供、檢查與檢點以及現場安全防護

施工後

1. 每日收工工地整理整頓
2. 施工人員生活垃圾每日清運
3. 工程廢棄物定期清運
4. 工程造成汙染區域立即清潔/確認無工程廢水排出
5. 材料機具設備盤點整齊堆置
6. 收工施工區域圈圍管制


目錄

- 一、匯盟能源公司介紹
- 二、預定施作範圍
- 三、施工期程
- 四、工程項目與施工方式
- 五、交維計畫
- 六、安全與衛生管理
- 七、緊急應變計畫

光電案場施工緊急救援組織圖

緊急通報專線：05-347-0177；0920-208-876


緊急通報聯絡人：匯盟能源布袋辦公室；謝嘉明

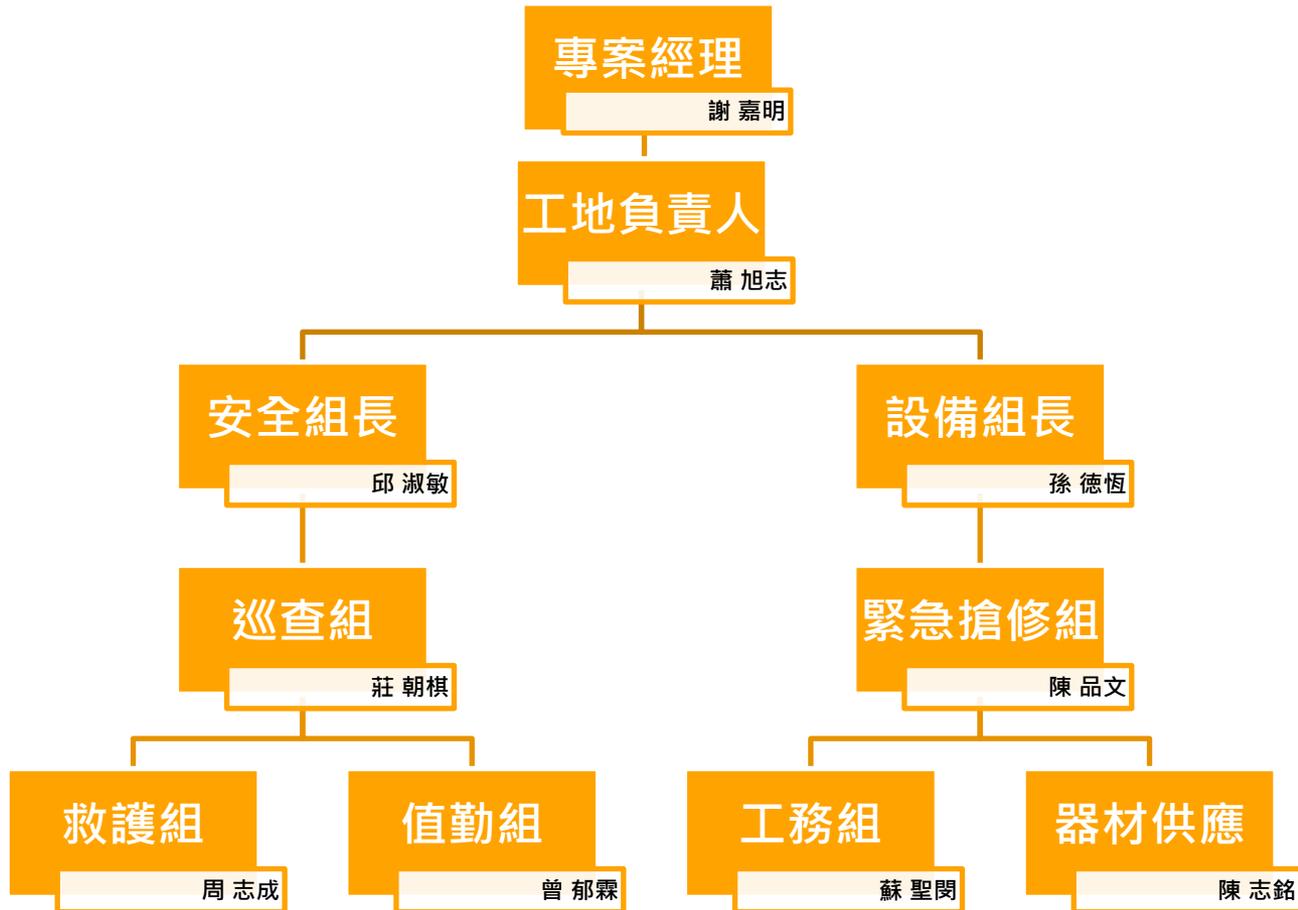

外管線、光電案場施工緊急救援組織圖


緊急通報專線：05-347-0177；0928-808-980

緊急通報聯絡人：匯盟能源布袋辦公室；周耀沅

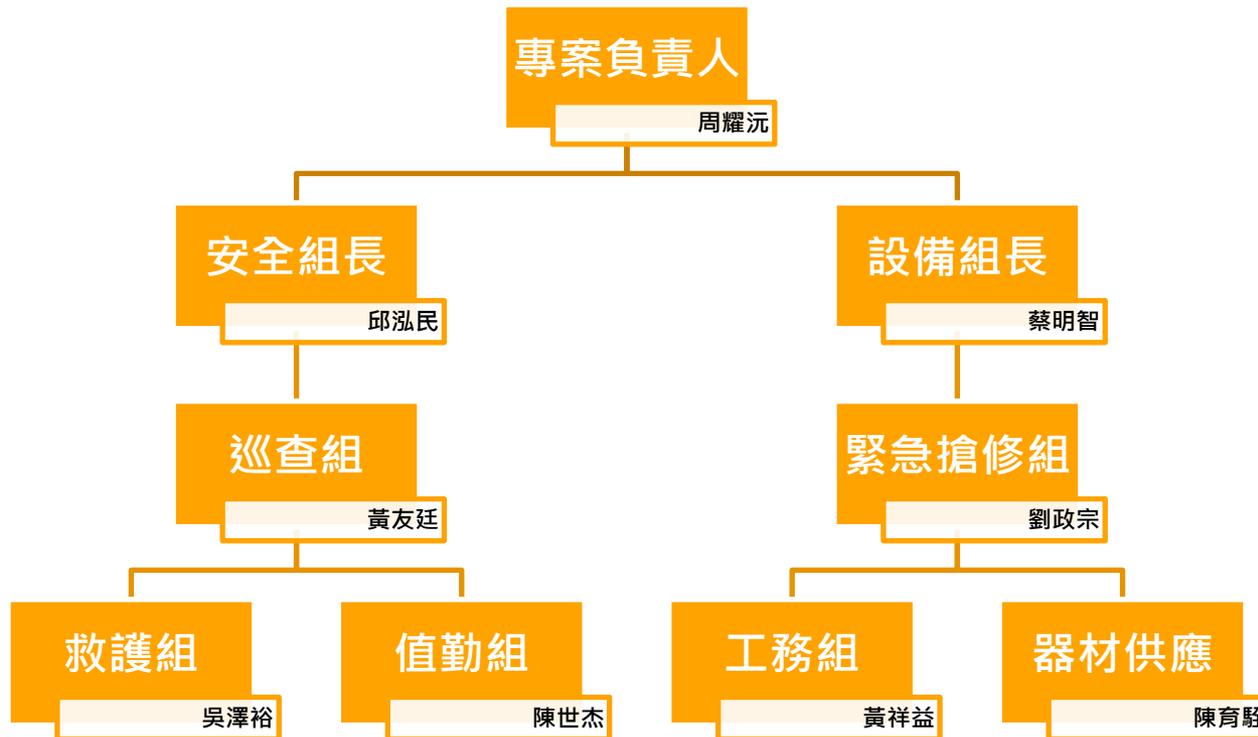


事故通報

事故通報程序

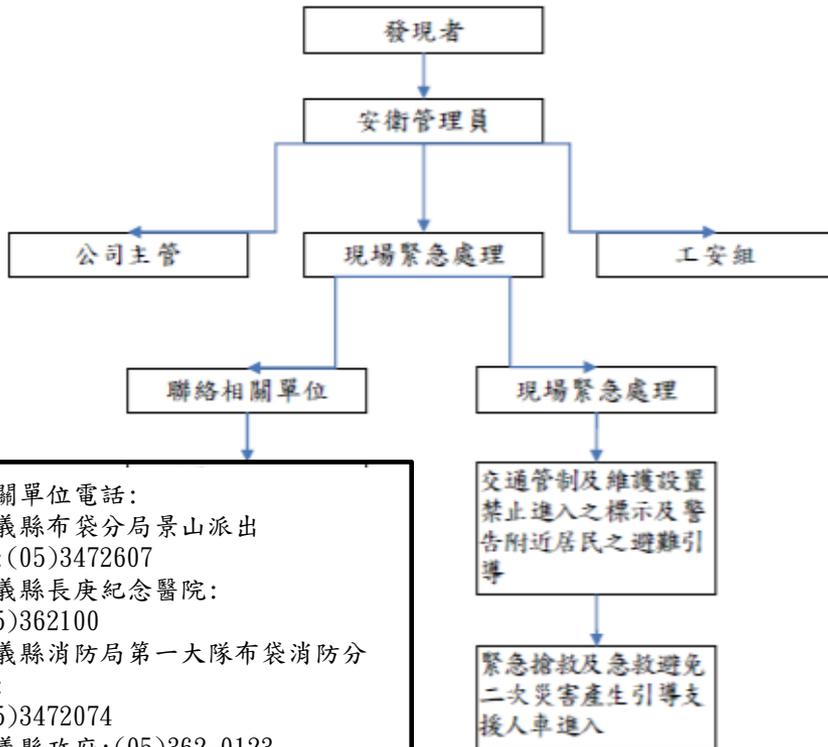

相關單位電話：
 嘉義縣布袋分局景山派出所：(05)3472607
 嘉義縣長庚紀念醫院：(05)362100
 嘉義縣消防局第一大隊布袋消防分隊：(05)3472074
 嘉義縣政府：(05)362-0123

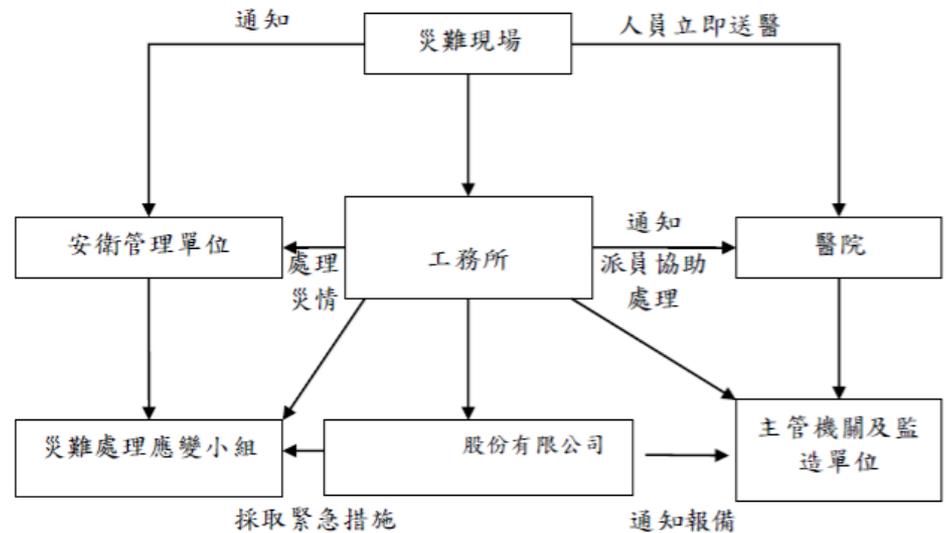

感謝聆聽 敬請指教
